

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 10月30日（水） 9：00 ～ 10月31日（木） 9：00	【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧 ^{※1} : 10月30日、31日 【主要検査】 ▶使用前事業者検査 ・原子炉隔離時冷却系(二号検査 ^{※2})
予定 10月31日（木） 9：00 ～ 11月1日（金）	【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧 ^{※1} ▶原子炉格納容器内点検 ▶タービン起動

※1 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作

※2 機能および性能を確認する検査

(添付資料) 女川原子力発電所2号機の再稼働工程

(参考)


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼10/31(9:00)現在

…進捗実績

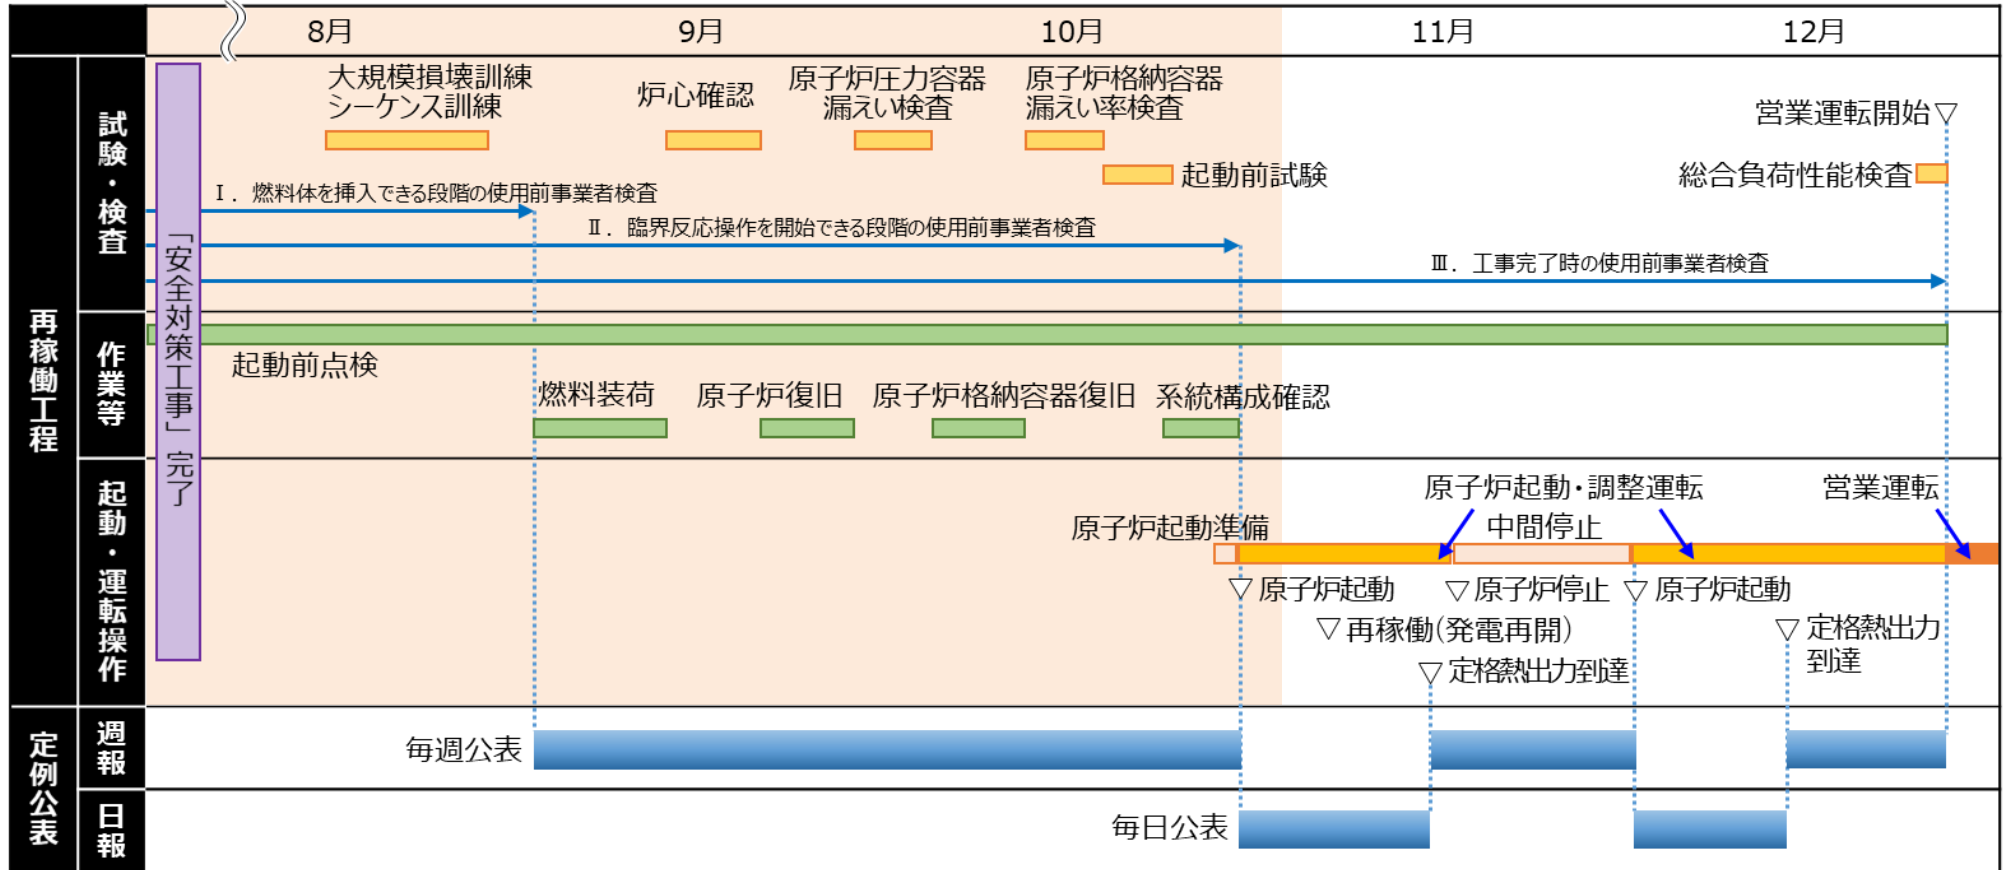

▼10/31(9:00)現在

