

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

| | 内 容 |
|--|--|
| 実績 10月31日（木） 9：00 ～ 11月1日（金） 9：00 | 【主要工程】 ▶原子炉昇温・昇圧 ^{※1} （10月30日～） ：10月31日、11月1日 ▶原子炉格納容器内点検：10月31日 |
| 予定 11月1日（金） 9：00 ～ 11月2日（土） | 【主要工程】 ▶タービン起動 ▶発電機試験併入 ^{※2} |

※1 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作

※2 タービン起動後に、タービンの振動を抑えるための重りの取り付け（バランス調整）が不要と判断した場合に実施する。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

- ・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼ 11/1(9:00)現在

…進捗実績

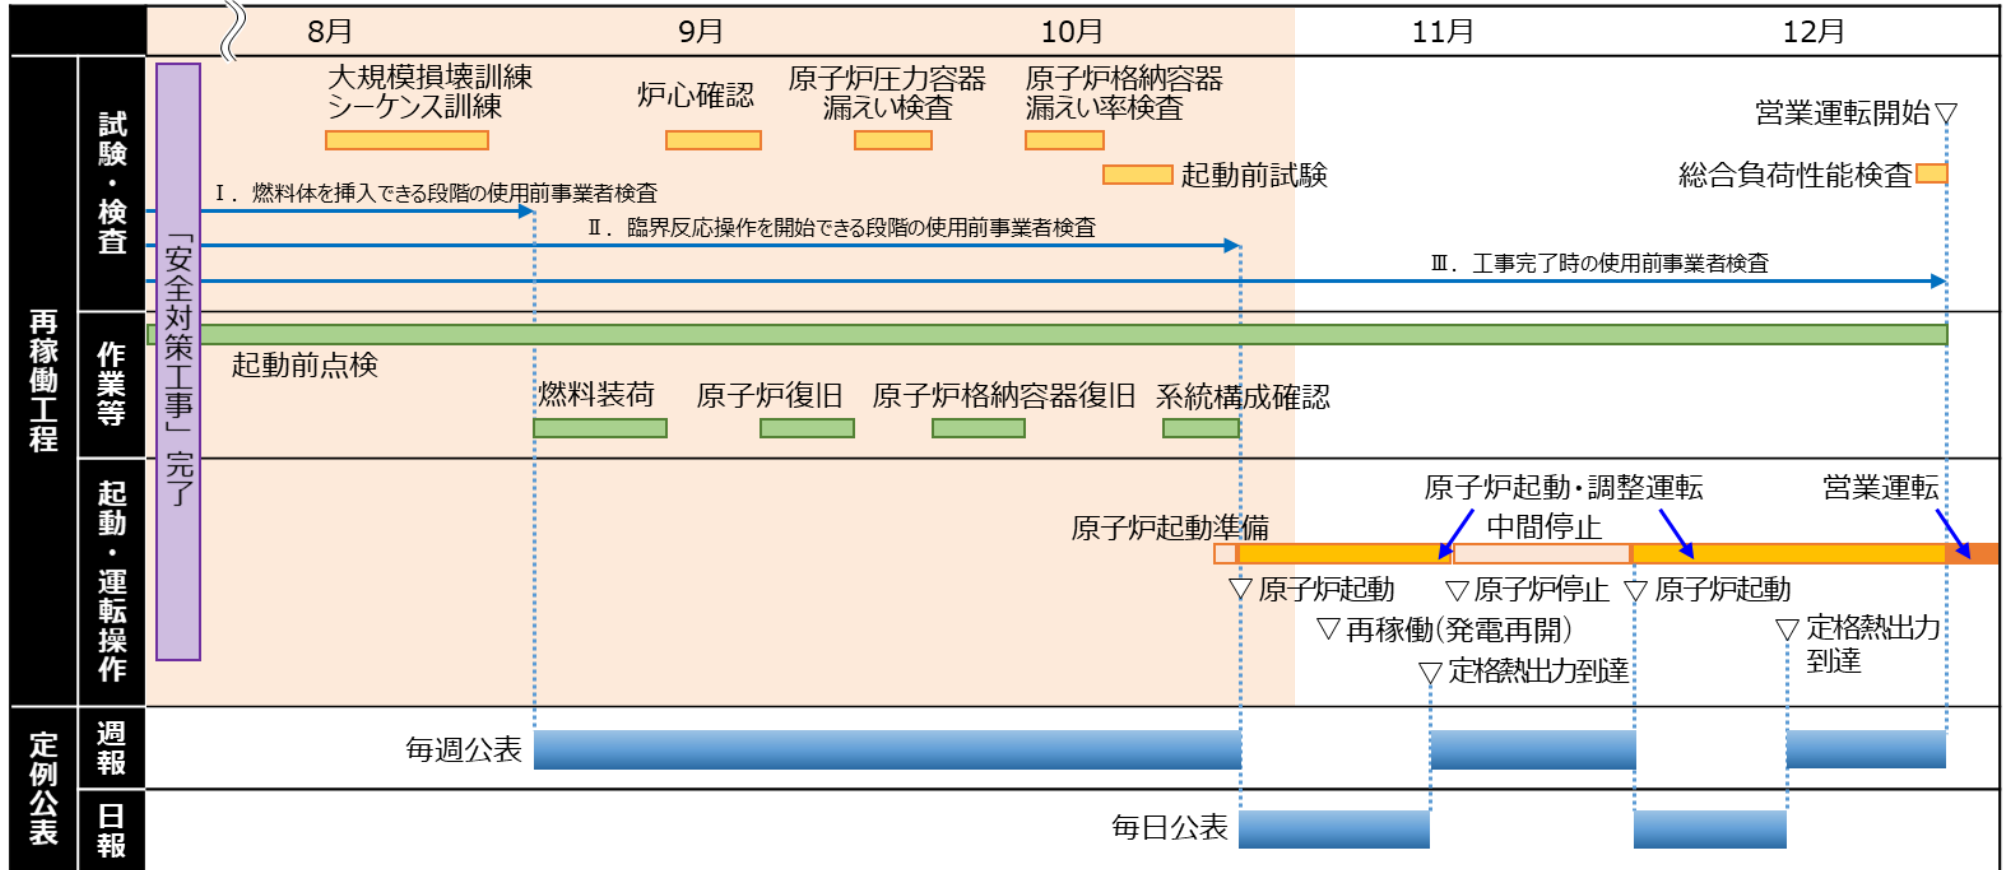

▼ 11/1(9:00)現在

