

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 11月1日（金） 9：00 ～ 11月2日（土） 9：00	【主要工程】 ▶タービン起動 : 11月1日（20：46）
予定 11月2日（土） 9：00 ～ 11月3日（日）	【主要工程】 ▶発電機試験併入 ▶再稼働（発電再開）※（11月3日予定） ▶発電機出力上昇 【主要検査】 ▶定期事業者検査 ・蒸気タービン性能検査（機械設備：保安装置検査）

※ タービン起動後のバランス調整が不要となり、その他プラントの状態確認も進み、11月7日と想定していた再稼働（発電再開）が前倒しとなる予定。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

- ・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼11/2(9:00)現在

…進捗実績

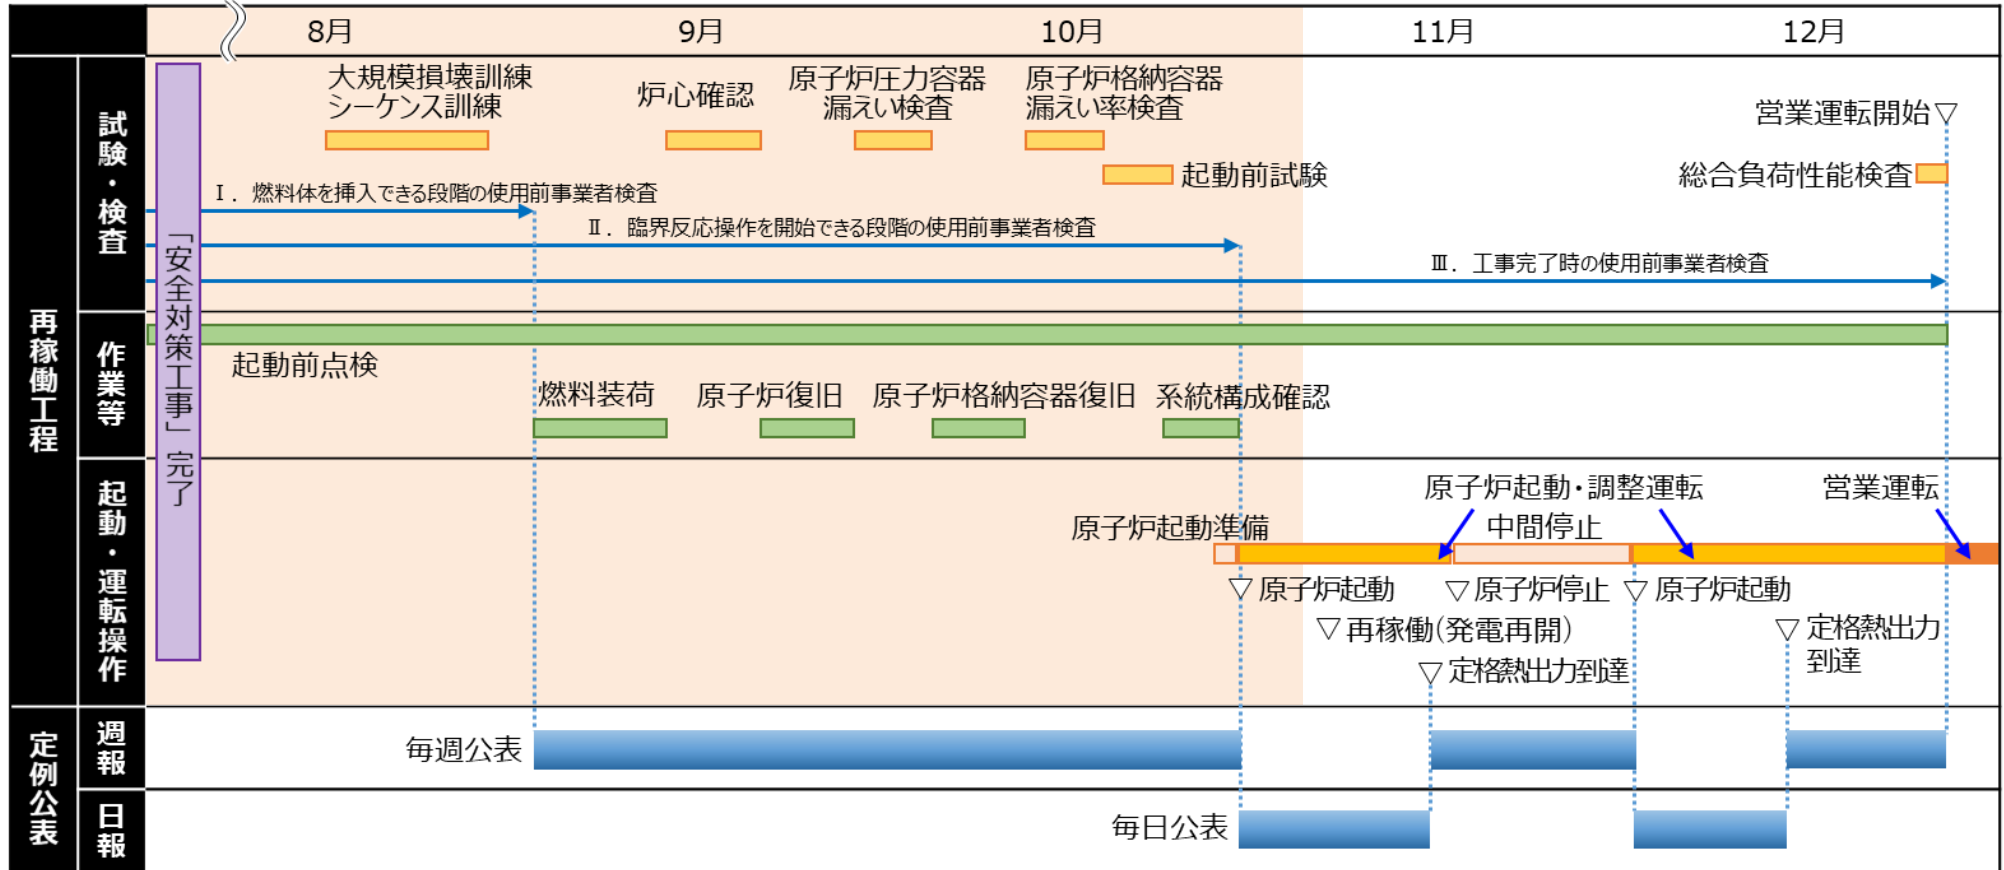

▼11/2(9:00)現在

