別紙

女川原子力発電所の状況（2026 年 10 月分）

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 1 号機の状況

2020 年 7 月 28 日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第 1 段階（解体工事準備期間）の作業を実施しております。

現在、1 号機使用済燃料プールから 3 号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送作業等を進めております。

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

（3）その他既にお知らせした事項

該当する事象はありませんでした。

2. 2 号機の状況

タービン建屋内に設置されている高圧第 1 給水加熱器(B)水室逃し弁から微量の水が排水槽に漏れ出ていることを踏まえ、10 月 17 日に原子炉を計画的に停止し、当該弁の取り替えを行った後、10 月 26 日に原子炉を起動、10 月 29 日に発電を再開しました。

（2026 年 10 月 17 日、10 月 26 日、10 月 29 日お知らせ済み）

その後、原子炉の出力を上昇させ、11 月 1 日に定格熱出力に到達しました。

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

（3）その他既にお知らせした事項

該当する事象はありませんでした。

3. 3 号機の状況

通常運転中のところ、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。

（2011 年 3 月 11 日お知らせ済み）

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

(1) 定期事業者検査の実施状況

2011 年 9 月 10 日より第 7 回定期事業者検査を実施しております。
現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。

（添付 女川原子力発電所 3 号機 第 7 回定期事業者検査 主要点検工程表 参照）

(2) 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

(3) 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

(4) その他既にお知らせした事項

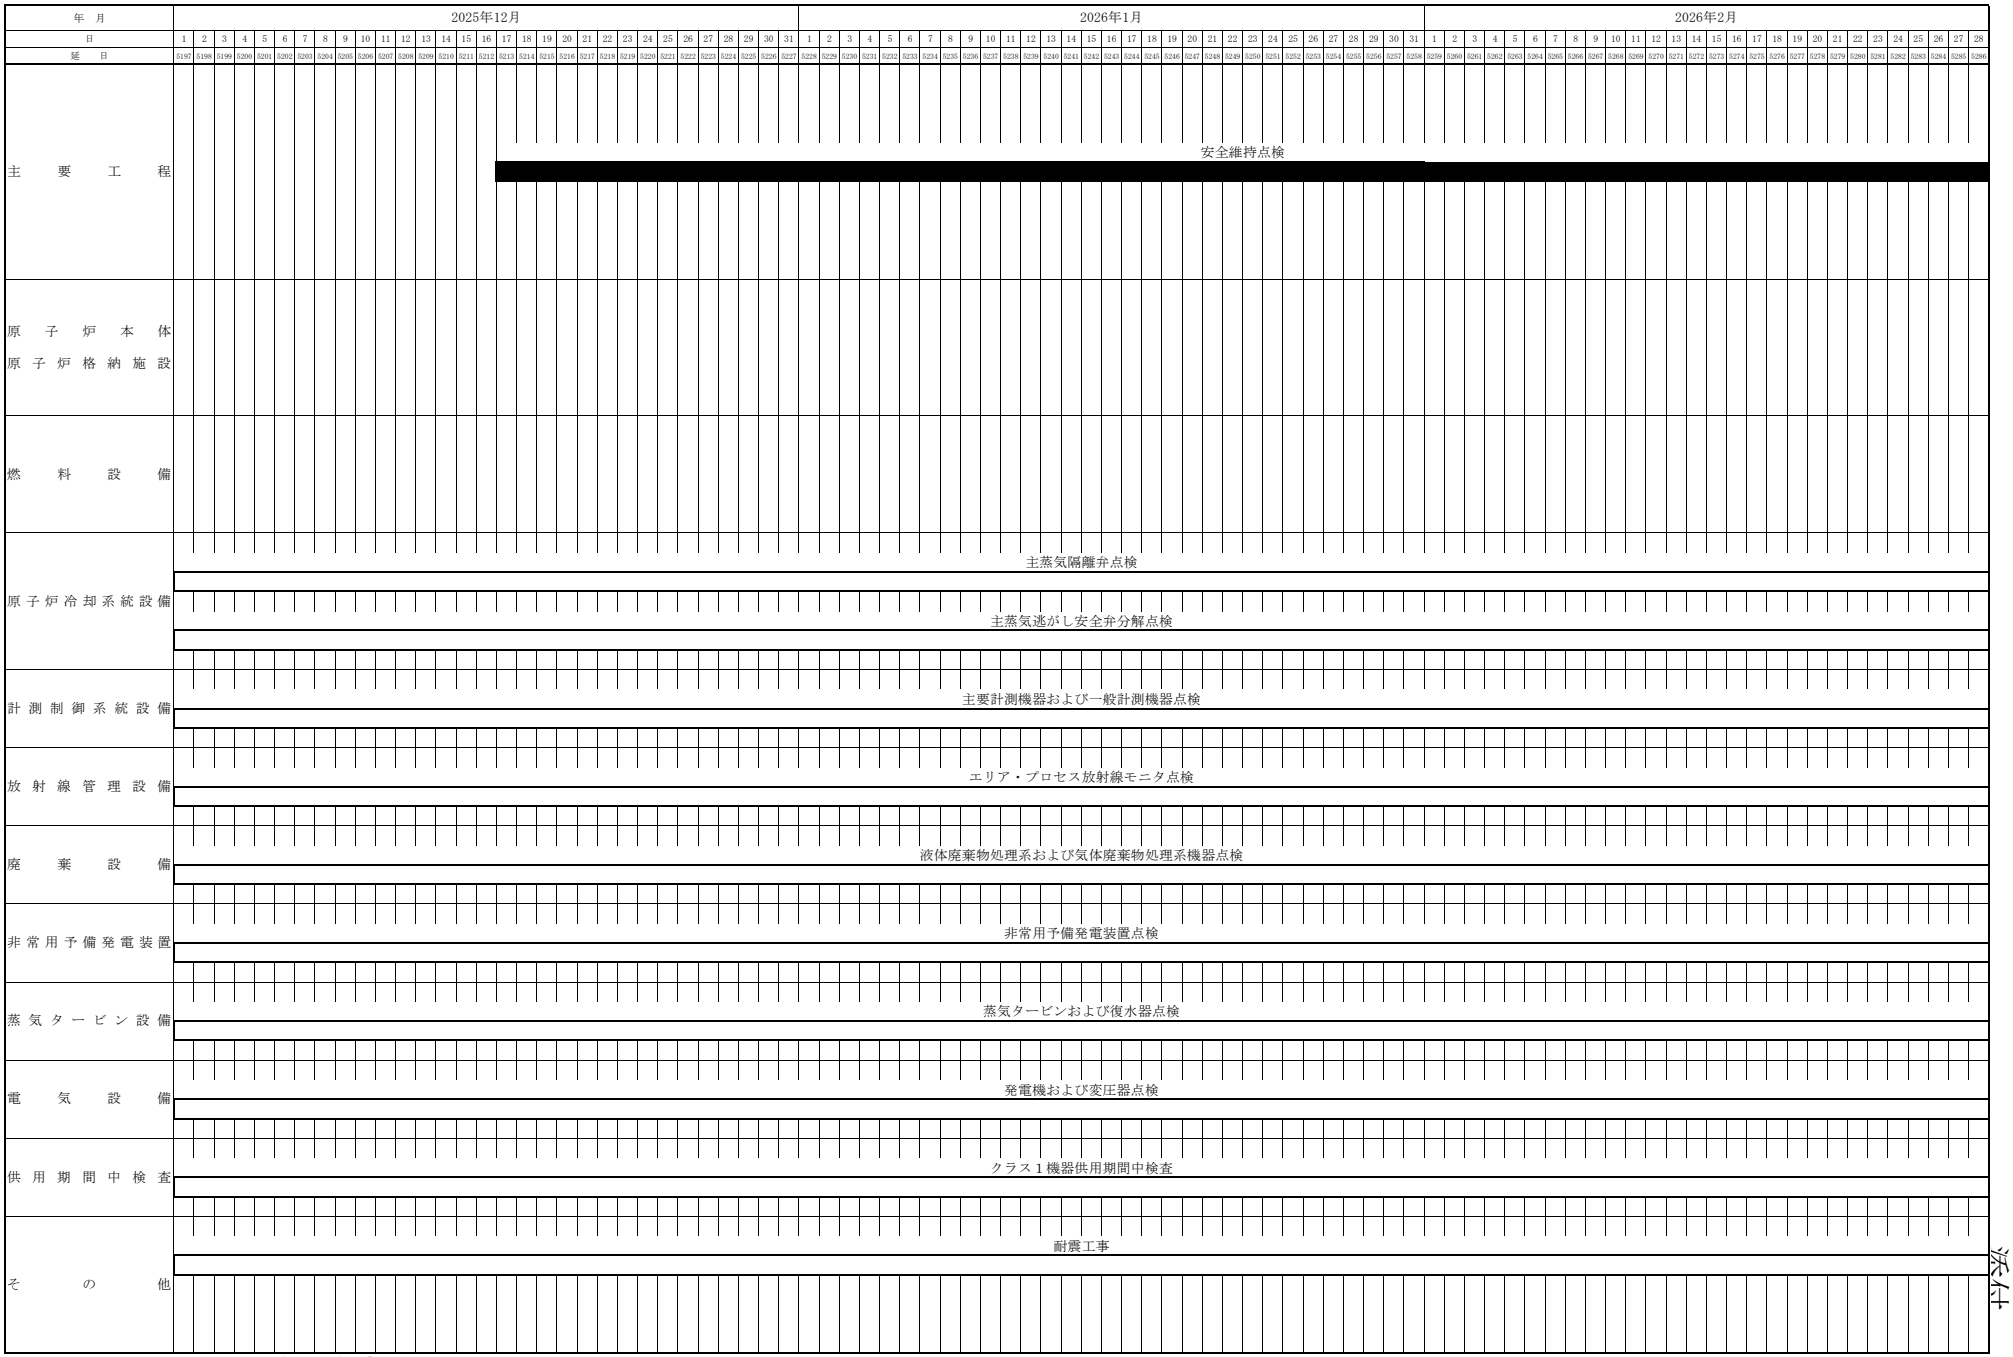
該当する事象はありませんでした。

4. 添付資料

添付 女川原子力発電所 3 号機 第 7 回定期事業者検査 主要点検工程表

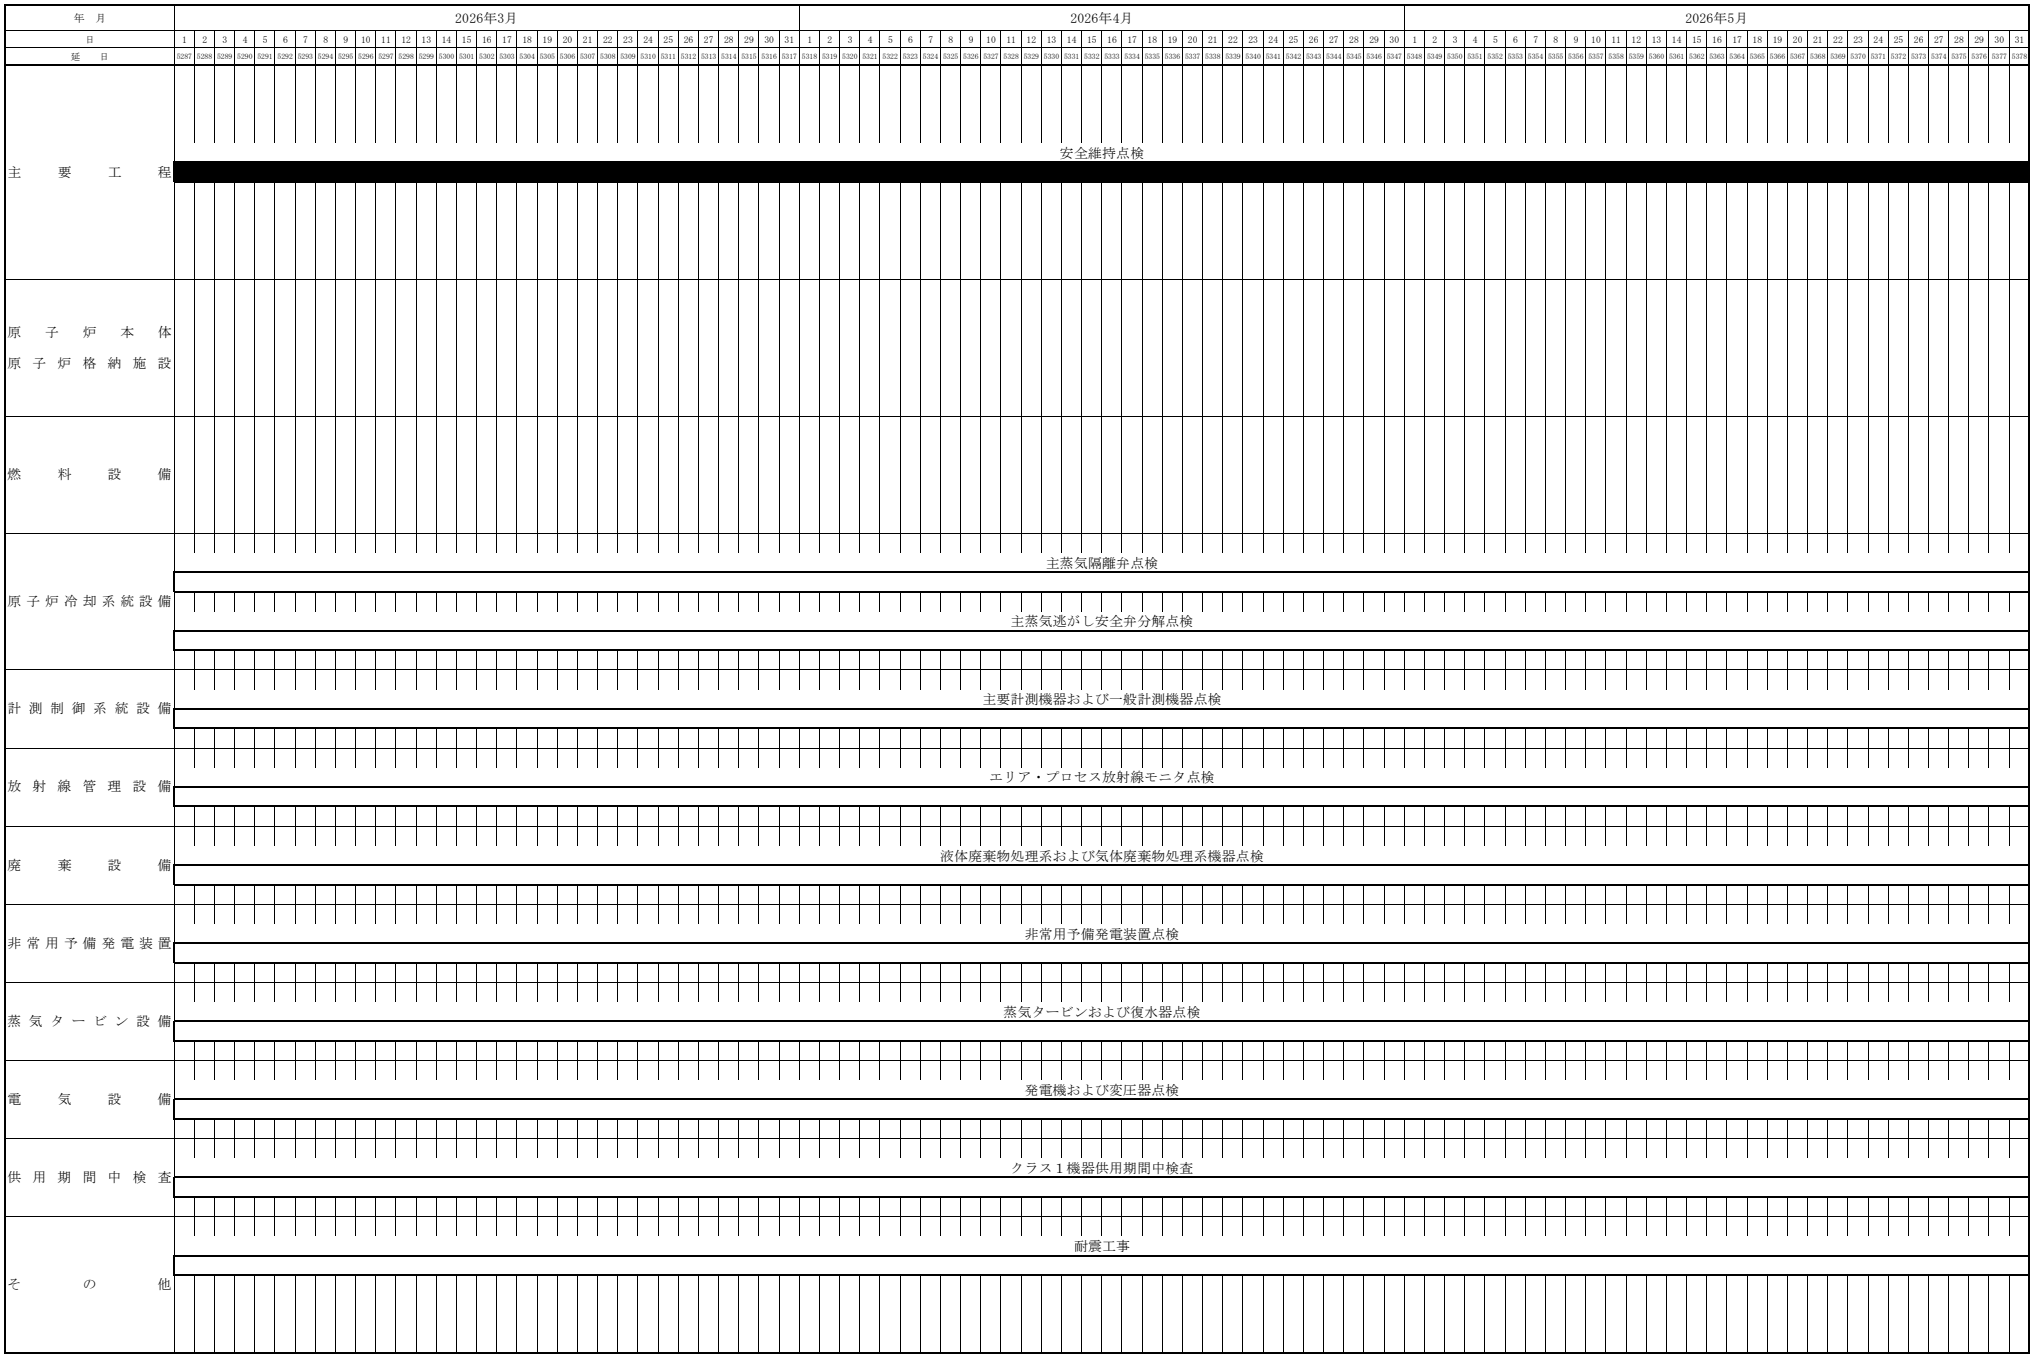
以 上

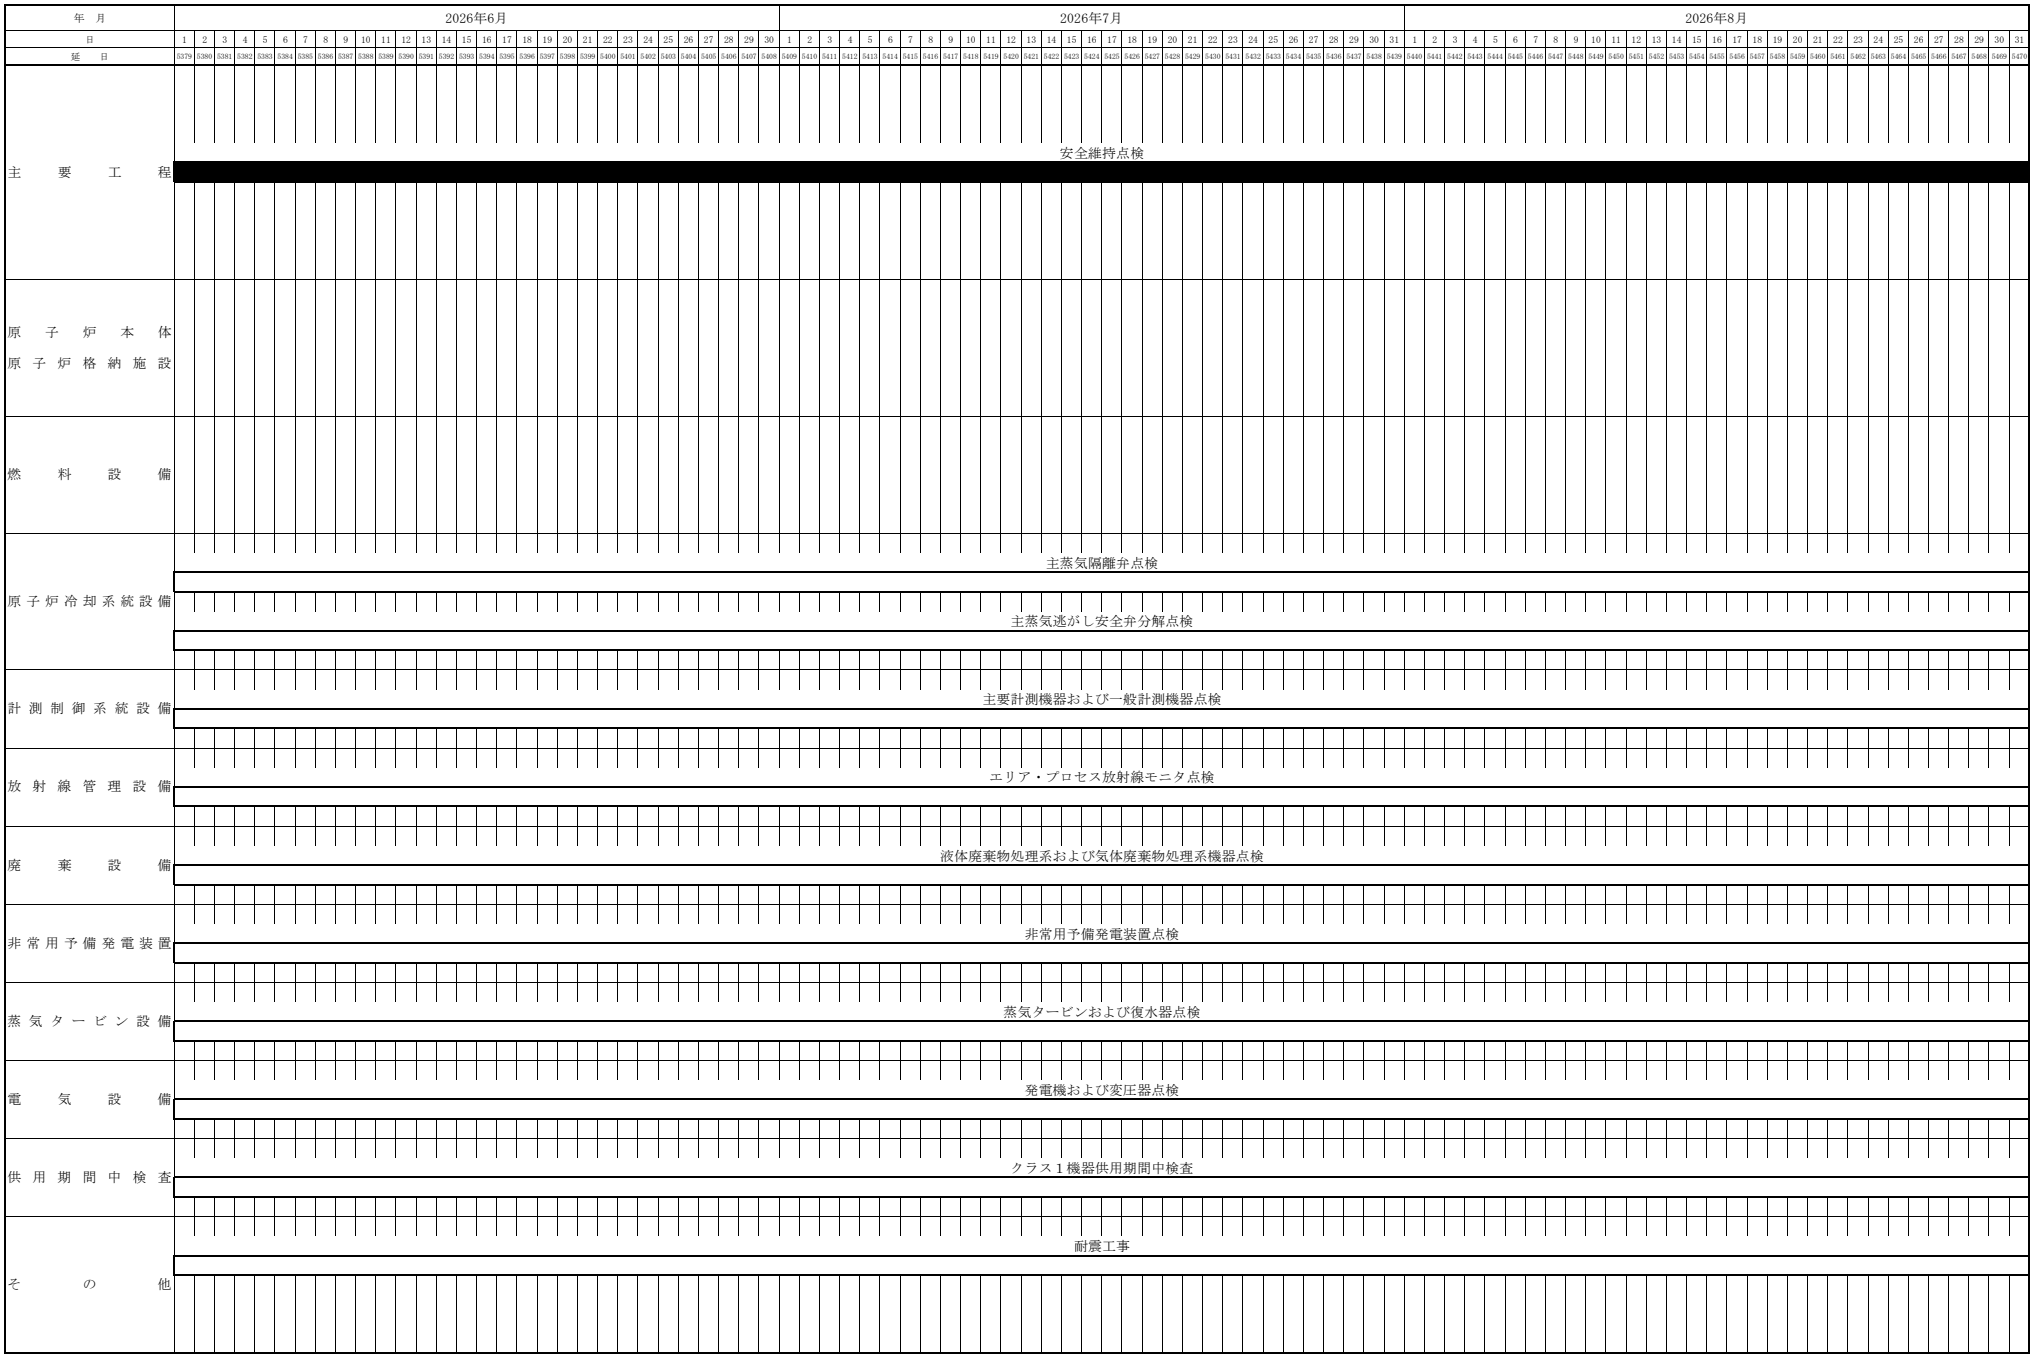
女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

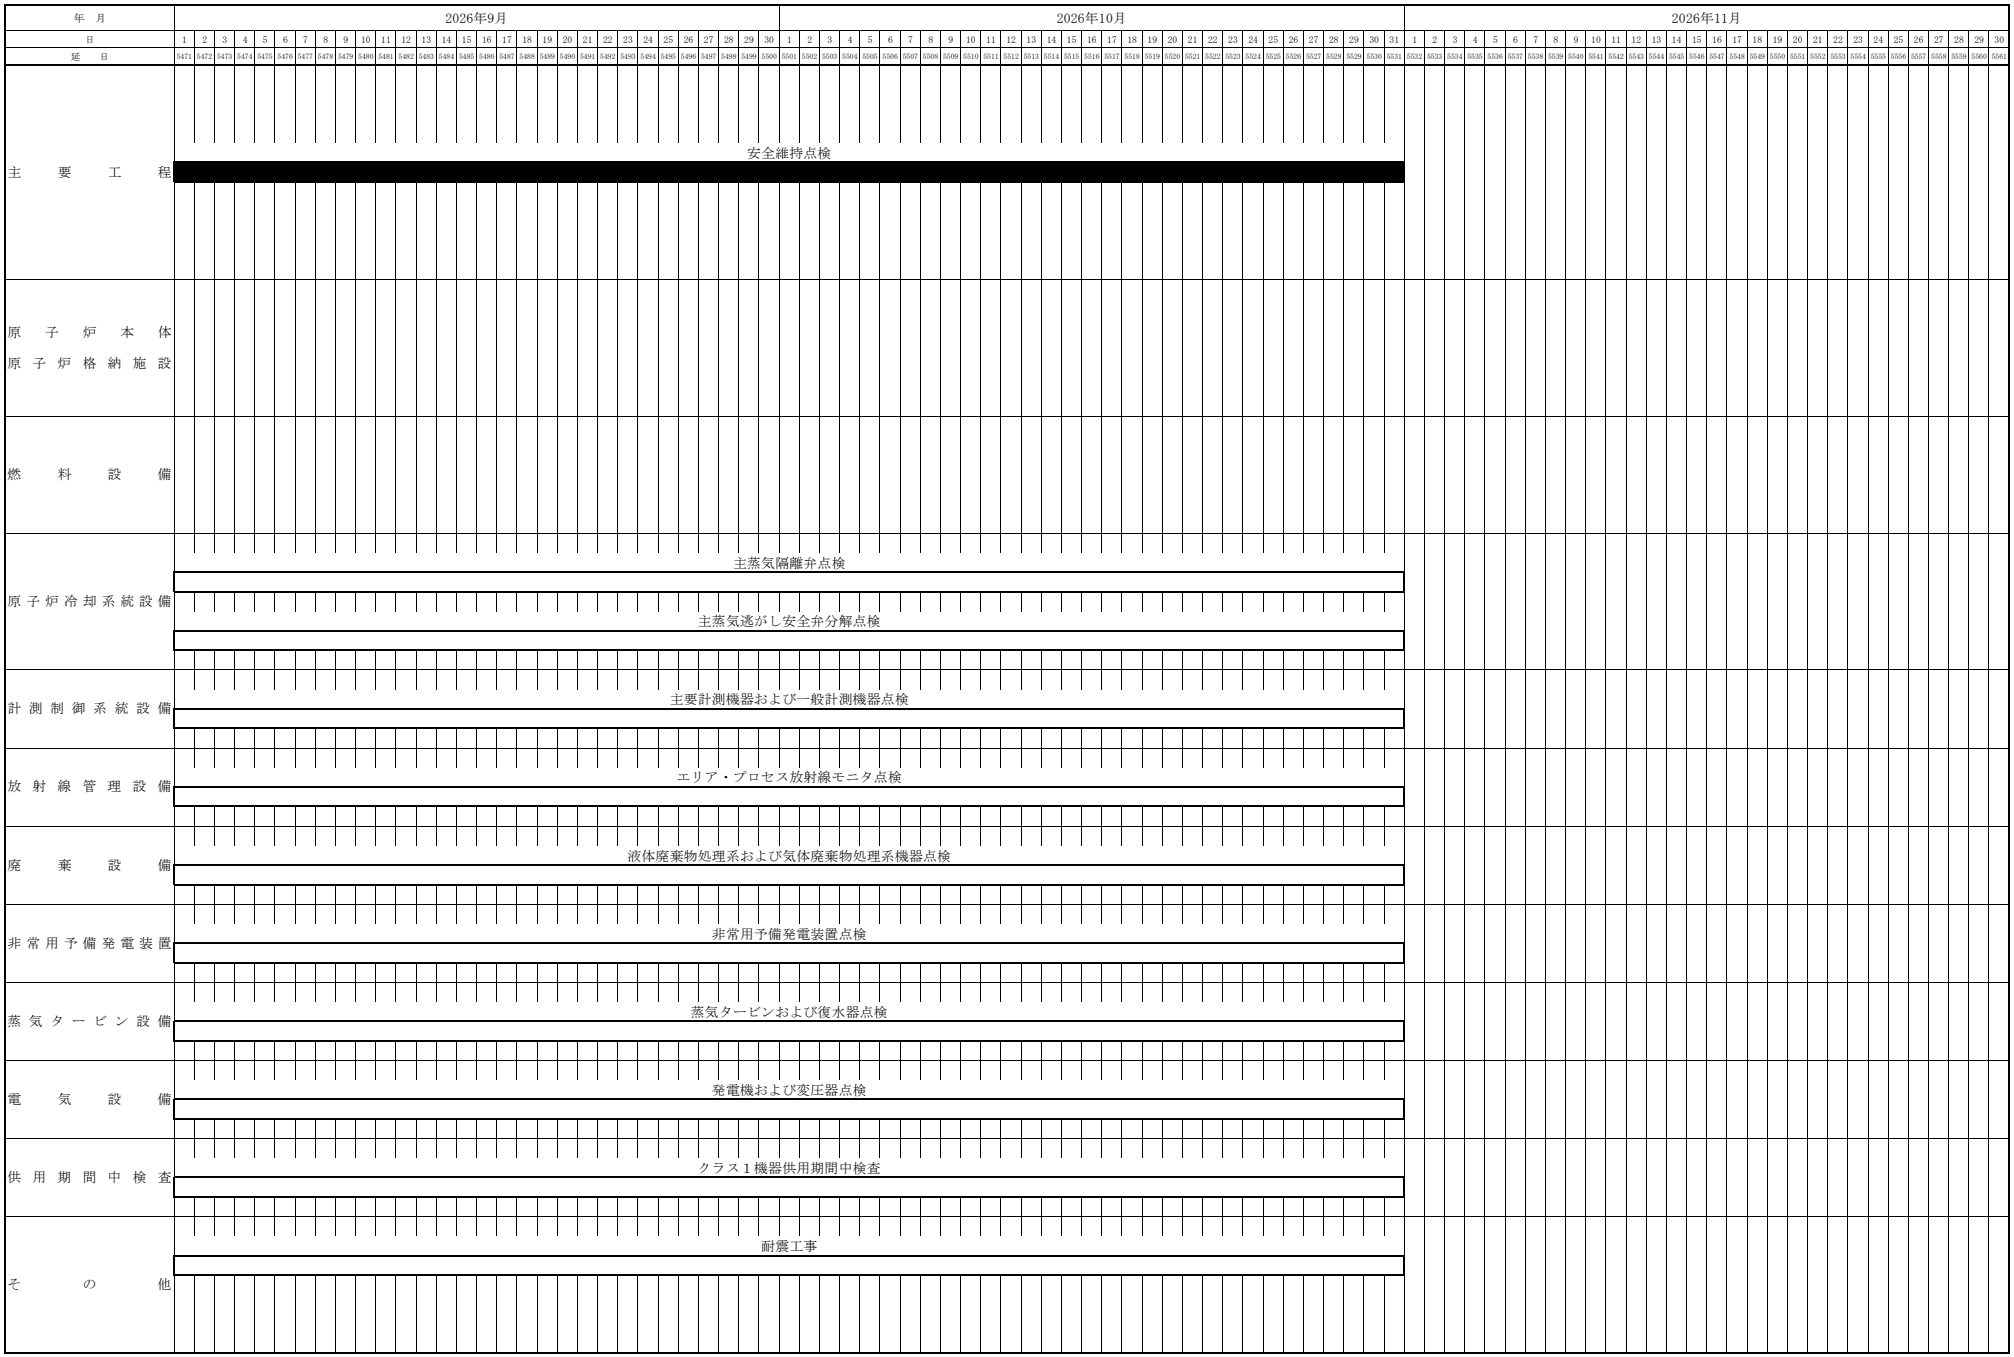


※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

添付


年月
2026年3月
2026年4月
2026年5月
日
延日
主要工程
安全維持点検
原子炉本体
原子炉格納施設
燃料設備
原子炉冷却系統設備
主蒸気隔離弁点検
主蒸気逃がし安全弁分解点検
計測制御系統設備
主要計測機器および一般計測機器点検
放射線管理設備
エリア・プロセス放射線モニタ点検
廃棄設備
液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検
非常用予備発電装置
非常用予備発電装置点検
蒸気タービン設備
蒸気タービンおよび復水器点検
電気設備
発電機および変圧器点検
供用期間中検査
クラス１機器供用期間中検査
その他
耐震工事


年月
2026年6月
2026年7月
2026年8月
日
延日
主要工程
安全維持点検
原子炉本体
原子炉格納施設
燃料設備
原子炉冷却系統設備
主蒸気隔離弁点検
主蒸気逃がし安全弁分解点検
計測制御系統設備
主要計測機器および一般計測機器点検
放射線管理設備
エリア・プロセス放射線モニタ点検
廃棄設備
液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検
非常用予備発電装置
非常用予備発電装置点検
蒸気タービン設備
蒸気タービンおよび復水器点検
電気設備
発電機および変圧器点検
供用期間中検査
クラス１機器供用期間中検査
その他
耐震工事


年月
2026年9月
2026年10月
2026年11月
日
延日
主要工程
安全維持点検
原子炉本体
原子炉格納施設
燃料設備
原子炉冷却系統設備
主蒸気隔離弁点検
主蒸気逃がし安全弁分解点検
計測制御系統設備
主要計測機器および一般計測機器点検
放射線管理設備
エリア・プロセス放射線モニタ点検
廃棄設備
液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検
非常用予備発電装置
非常用予備発電装置点検
蒸気タービン設備
蒸気タービンおよび復水器点検
電気設備
発電機および変圧器点検
供用期間中検査
クラス１機器供用期間中検査
その他
耐震工事
